



T. M. HIDRO-SZER KFT.

Vízellátás, Csatornázás, Vízrendezés, Uszodák, Tervezés - Kivitelezés
7622 Pécs, Vasút u. 2/a. Telefon: 72/513-360, 70/629-6214; Fax.: 72/513-363;
e-mail: tmhidro@tmhidro.hu, honlap: www.tmhidro.hu

ÁTADÁSI DOKUMENTÁCIÓ

**BARCS, 01174/3, VALAMINT A 0628 HRSZ-Ú INGATLANOKON
1-1 DB MONITORING KÚT LÉTESÍTÉSE**





T. M. HIDRO-SZER KFT.

Vízellátás, Csatornázás, Vízrendezés, Uszodák, Tervezés - Kivitelezés
7622 Pécs, Vasút u. 2/a. Telefon: 72/513-360, 70/629-6214; Fax.: 72/513-363;
e-mail: tmhidro@tmhidro.hu, honlap: www.tmhidro.hu

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY

Munka megnevezése:

***BARCS, 01174/3, VALAMINT A 0627 HRSZ-Ú INGATLANOKON
1-1 DB MONITORING KÚT LÉTESÍTÉSE***

Átadott dokumentációk:

2 példány nyomtatott átadási dokumentáció



Pécs, 2017. 05. 19.

Az átvevő megnevezése (cég, név):


.....
aláírás

Az átadó megnevezése (cég, név):


.....
aláírás



JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2017. 05. 19... napon Barcsi Ó-Dráva, az építési területen.

Tárgy: LIFE Old-Drava LIFE 13/NAT/HU388 pályázatból megvalósult 2 db talajvízszint figyelő kutak műszaki átadás-átvételi eljárása.

Jelen vannak:

Parrag Tibor Megrendelő részéről:
Nagy Dávid Vállalkozó részéről

Káldiné Fejesz Eszter. Somogy M. Kormányhivatal, Kaposvári Járási Hivatal, Agárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Erdészeti Osztály

Buzsáki Gábor Somogy M. Kormányhivatal, Kaposvári Járási Hivatal, Agárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Erdészeti Osztály

Bitó Irén. Somogy M. Kormányhivatal, Kaposvári Járási Hivatal, Agárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Erdészeti Osztály

A felek képviselői az építési területet együttesen bejárták; az építési, illetve kivitelezési tervekkel az elkészült létesítményt részletesen összevetették, egyeztették.

Együttesen ellenőrizték az építési naplót és a szakhatósági előírások betartását.

Megállapították, hogy a kivitelezés az építési engedélynek, a műszaki terveknek megfelelően történt, egyeztetve a helyszínrajzzal.

A műszaki és szakhatósági előírásokat a kivitelező betartotta.

Erdőterület igénybevétele eljárás ügyében a Somogy M. Kormányhivatal, Kaposvári Járási Hivatal, Agárügyi és Környezetvédelmi Főosztály, Erdészeti Osztály képviselői EJK 0019641 számon külön jegyzőkönyvet vettek fel

A kivitelezés a 35200/153-7/2017 ügyiratszámú vízjogi létesítési engedély előírásoknak megfelelően történt.

A korábbi területi egyeztetésnek megfelelő módon az MK-2 kút Barcs 0628 hrsz helyett a 0627 hrsz-on került kialakításra, ennek koordinátáját az átadási dokumentumban található mérési vázlat rögzíti.

A felek megállapítják, hogy a kivitelezés I. osztályú minőségű.


A közös megtekintés során megállapítást nyert, hogy a vállalkozási szerződés mellékleteinek, illetve a műszaki leírásnak megfelelően készült a kivitelezés.


A Megrendelő a munkát a mai nappal a Vállalkozótól átveszi, és ezzel tudomásul veszi egyrészt, hogy a kárveszély az átvétel időpontjától a Megrendelőre száll át.

A felek megállapítják, hogy a munka befejezése a Megrendelő által kitűzött határidőre megtörtént.

Jelen átadás-átvételi jegyzőkönyvhöz a felek mellékelik a Megrendelő felelős műszaki vezetőjének kivitelezői nyilatkozatát.

Kelt: 2017. 05. 19 Barcs-Drávaszentes



.....
Megrendelő


.....
Vállalkozó

Melléklet

- építési napló
- átadási dokumentáció
- talajvízszint figyelő kutak kulcsai

Kelt: 2017. 05. 19 Barcs-Drávaszentes.....


.....
Megrendelő


.....
Vállalkozó



T. M. HIDRO-SZER KFT.

Vízellátás, Csatornázás, Vízrendezés, Uszodák, Tervezés - Kivitelezés

7622 Pécs, Vasút u. 2/a. Telefon: 72/513-360, 70/629-6214; Fax.: 72/513-363;

e-mail: tmhidro@tmhidro.hu, honlap: www.tmhidro.hu

ÁTADÁSI DOKUMENTÁCIÓ

Tartalomjegyzék

BARCS, 01174/3, VALAMINT A 0627 HRSZ-Ú INGATLANOKON

1-1 DB MONITORING KÚT LÉTESÍTÉSE

- **Kivitelezői nyilatkozat**
- **Felelős műszaki vezetői nyilatkozat**
- **Építési napló másolata**
- **Munkaterület átadási jegyzőkönyv**
- **Tulajdoni lapok, térképmásolatok**
- **101/2007. (XII.23) KvVM rendelet szerinti adatlapok**
- **Geodéziai mérési jegyzőkönyv**
- **Teljesítmény nyilatkozatok, megfelelőségi nyilatkozatok:**
 - cement
 - KM-PVC idomok
 - V-PVC réselt szűrő
- **Megvalósulási tervek**
 - Átnézeti helyszínrajz – Megvalósult állapot
 - Helyszínrajz – Megvalósult állapot

Pécs, 2017. május 19.



T. M. HIDRO-SZER KFT.

Vízellátás, Csatornázás, Vízügy, Uszodák, Tervezés - Kivitelezés
7622 Pécs, Vasút u. 2/a. Telefon: 72/513-360, 70/629-6214; Fax: 72/513-363;
e-mail: tmhidro@tmhidro.hu, honlap: www.tmhidro.hu

KIVITELEZŐI NYILATKOZAT

Alulírott Tóth Mihály, mint T. M. HIDRO – SZER KFT. Pécs, Vasút u.2/a. ügyvezetője büntetőjogi és anyagi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy

BARCS, 01174/3, VALAMINT A 0627 HRSZ-Ú INGATLANOKON

1-1 DB MONITORING KÚT LÉTESÍTÉSE

a kiviteli terveknek megfelelően készült el a jelenleg érvényben lévő vonatkozó műszaki és szakhatósági előírások, valamint a vonatkozó szabványok betartásával.

Felelős műszaki vezető: Tóth Mihály

MV-VZ/A-02-51059

MV-Ép/A-02-51059.

A létesítmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas.

Pécs, 2015.10.14.

Tóth Mihály
okl. építőmérnök
vezető tervező,
vízimérnöki szakértő
felelős műszaki vezető
műszaki ellenőr

⁴ Amennyiben az építési munkát a jóváhagyott műszaki tervdokumentációtól eltérően végezték, de az eltérés nem minősül építési engedélyhez kötött építési munkának, a felelős műszaki vezető eltérést ismertető nyilatkozatát 1 példányban, valamint az ezt ábrázoló állapottervet 4 példányban szükséges mellékelni.

pátria nyomda

Építési napló, naplórész

B. Ért. 820/új/V

25×2 lapos tömb + 9 garn

Építmény megnevezése

Boros Munkaterv

Címe

01174/3 Hrsz. MK-1 és 0627 Hrsz. MK-2 kút

A naplórész kötet száma

A naplórész megkezdésének kelte

2017

02

hó

15

nap

A naplórész lezárásának kelte

év

hó

nap



pátria nyomda

pátria irodaszer

pátria partner

Alkalmazás megnevezése: 1-1 DB MOBILITÁSI KÖRFEJESZTÉSI MUNKÁI

Címe: BAKCS, 01124/3455, 0627455

Naplómelléklet típusa: szerződés/oldalszám: 2

Nyilvántartási rész (Szerződés)

Építési-szerelési munka:

Megnevezése:

1-1 DB MOBILITÁSI KÖRFEJESZTÉSI MUNKÁI

Helye (település, utca, házszám, HRSZ):

BAKCS, 01124/3455, 0627455

Alkalmazás:

új építés, bontás, átalakítás, fenntartás, felújítás, karbantartás, egyéb:

* aláhúzendő

Szerződés főbb adatai:

Kelte:

2016 év 06. hó 27. nap

Munkaterület átadás:

2017 év 02. hó 15. nap

Szerződés szerinti befejezési határidő:

2017 év 02. hó 28. nap

Tényleges befejezési határidő:

..... év hó nap

Részhatáridők:

..... megnevezés	 év	 hó	 nap
..... megnevezés	 év	 hó	 nap
..... megnevezés	 év	 hó	 nap
..... megnevezés	 év	 hó	 nap
..... megnevezés	 év	 hó	 nap

Szerződésmódosítások:

Kelte: év hó nap

Kelte: év hó nap

Kelte: év hó nap

2017. 02. 14.

dátum

megbízó

T.M. HIDRO-SZER Kft. (2.)
Vízellátás, csatornázás, uszodatechnika
Szökőkutak, szennyvíz házi átemelők
7622 Pécs, Vasút u. 2/a.
Adószám: 11944447-2-02
Vállalkozó

Építmény megnevezése: Baros 01174/3 és 0627 hrs ingatlanok
címe: 1-1 és 1-2 sz. művelődési ház

Naplómelléklet típusa: megrendelő/oldalszám:

Nyilvántartási rész (Megrendelő)

Megrendelő (építtető):

Név (elnevezése):

DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK

Cím (székhelye):

PÉCS, JETTYE TÉR 9

Naplóbejegyzésre jogosult képviselője:

PARDACH TISZ

Ellenőrző:

Az építmény rendeltetése szerinti:

szakági:

Cím, telefonszáma:

Naplóbejegyzési bejegyzés száma:

szakági:

Neve:

Cím, telefonszáma:

Naplóbejegyzési bejegyzés száma:

szakági:

Neve:

Cím, telefonszáma:

Naplóbejegyzési bejegyzés száma:

szakági:

Neve:

Cím, telefonszáma:

Naplóbejegyzési bejegyzés száma:

A beruházás-lebonyolító:

Neve (elnevezése):

Cím (székhelye):

Naplóbejegyzésre jogosult képviselője:

2017. 10. 2. 15

dátum

megbízó

vállalkozó

Építmény megnevezése, címe: Barcs 011413 és 0627 hrsz
ingatlanon 1-1 db monitoring unit
füves
Naplómelléklet típusa: vállalkozó (fővállalkozó)/oldalszám:

Nyilvántartási rész Vállalkozó (fővállalkozó)

Vállalkozó (fővállalkozó) kivitelező:

Név (megnevezése):

T.M. HIDRO-NEK KFT

Hely (telephelye):

7622 Pécs Várúti út 21A

Telefonszáma:

0644447-2-02

Vállalkozó (fővállalkozó) engedély
számjegyzéki bejegyzés száma:

02-08-0776 066762

Nyilvántartási száma:

34A 25402

Engedélyezésre jogosult képviselője:

Tóth Mihály, Leborok József

Előzetes műszaki vezető:

Az építmény rendeltetése szerinti:

vízellátás

szakági:

Név:

Tóth Mihály

Címe, telefonszáma:

80/500-7807 Pécs, Martinkó út 13.

Számjegyzéki bejegyzés száma:

02-51059

szakági:

Név:

Címe, telefonszáma:

Számjegyzéki bejegyzés száma:

szakági:

Név:

Címe, telefonszáma:

Számjegyzéki bejegyzés száma:

szakági:

Név:

Címe, telefonszáma:

Számjegyzéki bejegyzés száma:

02.15
2017.08.22

dátum

megbízó

vállalkozó

Az építmény megnevezése: BARCS 0627 Hrsz MK-2

címe: Monitoringkut

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma: A napló oldalszáma:

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
2017.02.15. Szerda	Munkaterület átadás, átvetel +5°C +8°C +5°C 2 fő (Megrendelő kérésére 0628 helyett 0627-as furva)
2017.03.22. Szerda	Időjárás reggel +6°C Délben +9. este +7°C 2 fő Felvonulás, Felkészülés, Anyagok kiszállítása Anyagok: Berendezés, Sűrítők, Rúdok, csövek
2017.03.23 csütörtök.	Fúrás $\phi 260$ fúróval $\phi 225/200$ mm acél védőcső elé R + 7°C D + 11°C E + 8°C 2 fő 0,0 - 1,0 m - ig Védőcső cemennterése 57 l/p cement
2017.03.24 Péntek	R + 7°C D + 10°C E + 7°C 2 fő Fúrás $\phi 180$ mm fúróval $\phi 125/115$ mm sűrítőcső elé - 1,0 - 6,0 m - ig Sűrítő - 2,0 - 5,0 m - ig Sűrítés, Klorisolás 200l Káros - 1,5 - 6,0 m - ig Klorisolálás $\phi 1-2$ mm ontólyrossal homok - 1,2 - 1,5 m - ig - Szórt Sűrítővel 57 l/p vízhozammal Talp: csőtetőtől: 6,8 m üzem. szint: 5,42 m csőtetőtől Terepszinttől 6,0 m üzem. szint: 4,62 m Terepszinttől
2017.03.25. Szombat.	R 7°C D 11°C E 6°C 2 fő $\phi 125/115$ KMPVC cső cemennterése + 0,4 m - 1,2 m - ig Tereprendezés Sűrítővel 57 l/p vízhozammal Készítés Betongaléria készítése $\rightarrow$ 0,59 cement 200l sódar
2017.04.26. Szerda	R. 6°C D 12°C E. 6°C 2 fő Sűrítővel 57 l/p vízhozammal Festés 50% vízelapódás beállítása 28 l/p vízhozam üzem. szint csőtetőtől - 4,73 m Terepszinttől - 3,92 m
2017.04.27. Csütörtök	R. 7°C D 15°C E. 8°C 2 fő Geodetikus bemérés MK-1 MK-2 kútok Vízszinttelődhöz mérés ledolgozás 57 l/p vízhozam Perc @ Csőtetőtől / m / Terepszinttől / m / 0. - 5,42 - 4,62 1. - 4,15 - 3,35 2. - 3,83 - 3,02 4. Nyugalmi - 3,69 szint. - 2,88 Nyugalmi szint 5 Nyugalmi szint - 3,69 - 2,88 Nyugalmi szint 10 Nyugalmi szint - 3,69 - 2,88 Nyugalmi szint

Az építmény megnevezése: Barcs 01/74/3 Hrsz MK-1 kút

címe: Monitoring kút.

EPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma: A napló oldalszáma:

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS																		
2017. 04. 18 Kedd	R: +8°C D: +18°C E: +10°C 3fő Felváltás felszerelési anyagok kinnállítása anyagok: Berendezés, csővel, rudak kavics cement. Fűtés ϕ 200mm fűtés ϕ 225/100mm acél védőcső elöl csővel Védőcső cementterése 0,0-1,0 m - 1g 0,5g cement.																		
2017. 04. 19. Szerda	R: +2 D: +5°C E: +3°C Eső 3fő Fűtés ϕ 125/115mm KMPVC csőterése elöl - 1,0-16,0 m - 1g Szűrés: Körösös kavics ϕ 1-2mm osztályozott kő Körös - 5,5-16,0 m - 1g 400L Hordó - 5,3-5,5 m - 1g Talpi csőtetőtől - 16,8m Terepintől - 16,0m Színnyílás 5fő l/p vízhozammal Közműváltó csőtetőtől - 7,3m Terepintől - 6,5m																		
2017. 04. 20. Csütörtök	R: +3°C D: +5°C E: +4°C Eső havi 3fő Színnyílás 5fő l/p vízhozammal ϕ 125/115mm KMPVC cső cementterése 10,4m - 5,3 m - 1g 1,5g cement. Tereprendezés, Készítés																		
2017. 04. 25. Kedd	R: +7°C D: +17°C E: +10°C 2fő Betongaléria készítése Cement 0,5g Sódor 200L Bundáztatás 5fő l/p vízhozammal Visszatöltődés mérés <table><tr><th>Perc</th><th>Csőtetőtől /m/</th><th>Terepintől /m/</th></tr><tr><td>0.</td><td>- 7,3</td><td>- 6,5</td></tr><tr><td>1.</td><td>- 6,83</td><td>- 6,03</td></tr><tr><td>2.</td><td>- 6,75 Nyugati mint.</td><td>- 5,97 Nyugati mint.</td></tr><tr><td>4.</td><td>- 6,75 Nyugati mint.</td><td>- 5,97 Nyugati mint.</td></tr><tr><td>5.</td><td>- 6,75 Nyugati mint.</td><td>- 5,97 Nyugati mint.</td></tr></table>	Perc	Csőtetőtől /m/	Terepintől /m/	0.	- 7,3	- 6,5	1.	- 6,83	- 6,03	2.	- 6,75 Nyugati mint.	- 5,97 Nyugati mint.	4.	- 6,75 Nyugati mint.	- 5,97 Nyugati mint.	5.	- 6,75 Nyugati mint.	- 5,97 Nyugati mint.
Perc	Csőtetőtől /m/	Terepintől /m/																	
0.	- 7,3	- 6,5																	
1.	- 6,83	- 6,03																	
2.	- 6,75 Nyugati mint.	- 5,97 Nyugati mint.																	
4.	- 6,75 Nyugati mint.	- 5,97 Nyugati mint.																	
5.	- 6,75 Nyugati mint.	- 5,97 Nyugati mint.																	
2017. 04. 27. Csütörtök	R: +8°C D: +17°C E: +12°C Geodetiai mérések																		

Az építmény megnevezése: Borcs 0624 Hrsz MK-2címe: Monitoring kút készítése

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma: A napló oldalszáma:

Kelet (hó és nap)	BEJEGYZÉS
$\phi 125/115$ mm KMPVC csatlós tetefe	$+0.8$ m $+0.4$ m 0.0 m -1.0 m -1.2 m -1.5 m 2.0 m -5 m Talp - 6 m
	vadász barázdák lokátor ponton lemer Terepszint cementohej furat $\phi 260$ mm cementohej horok. furat $\phi 180$ mm $\phi 125/115$ mm KMPVC csatlós $\phi 0.5$ mm résmérettel $\phi 1-2$ mm szűrőlyukú mosott dinszhorok csoporsók Talp lezárás $\phi 125$ mm PVC végeléc


Sorszám: F0146504

Építmény megnevezése: Barcs 01/74/3Hrsz MK-1

címe: Monitoringkút helyrajza

ÉPÍTÉSI NAPLÓ

Kötet száma: A napló oldalszáma:

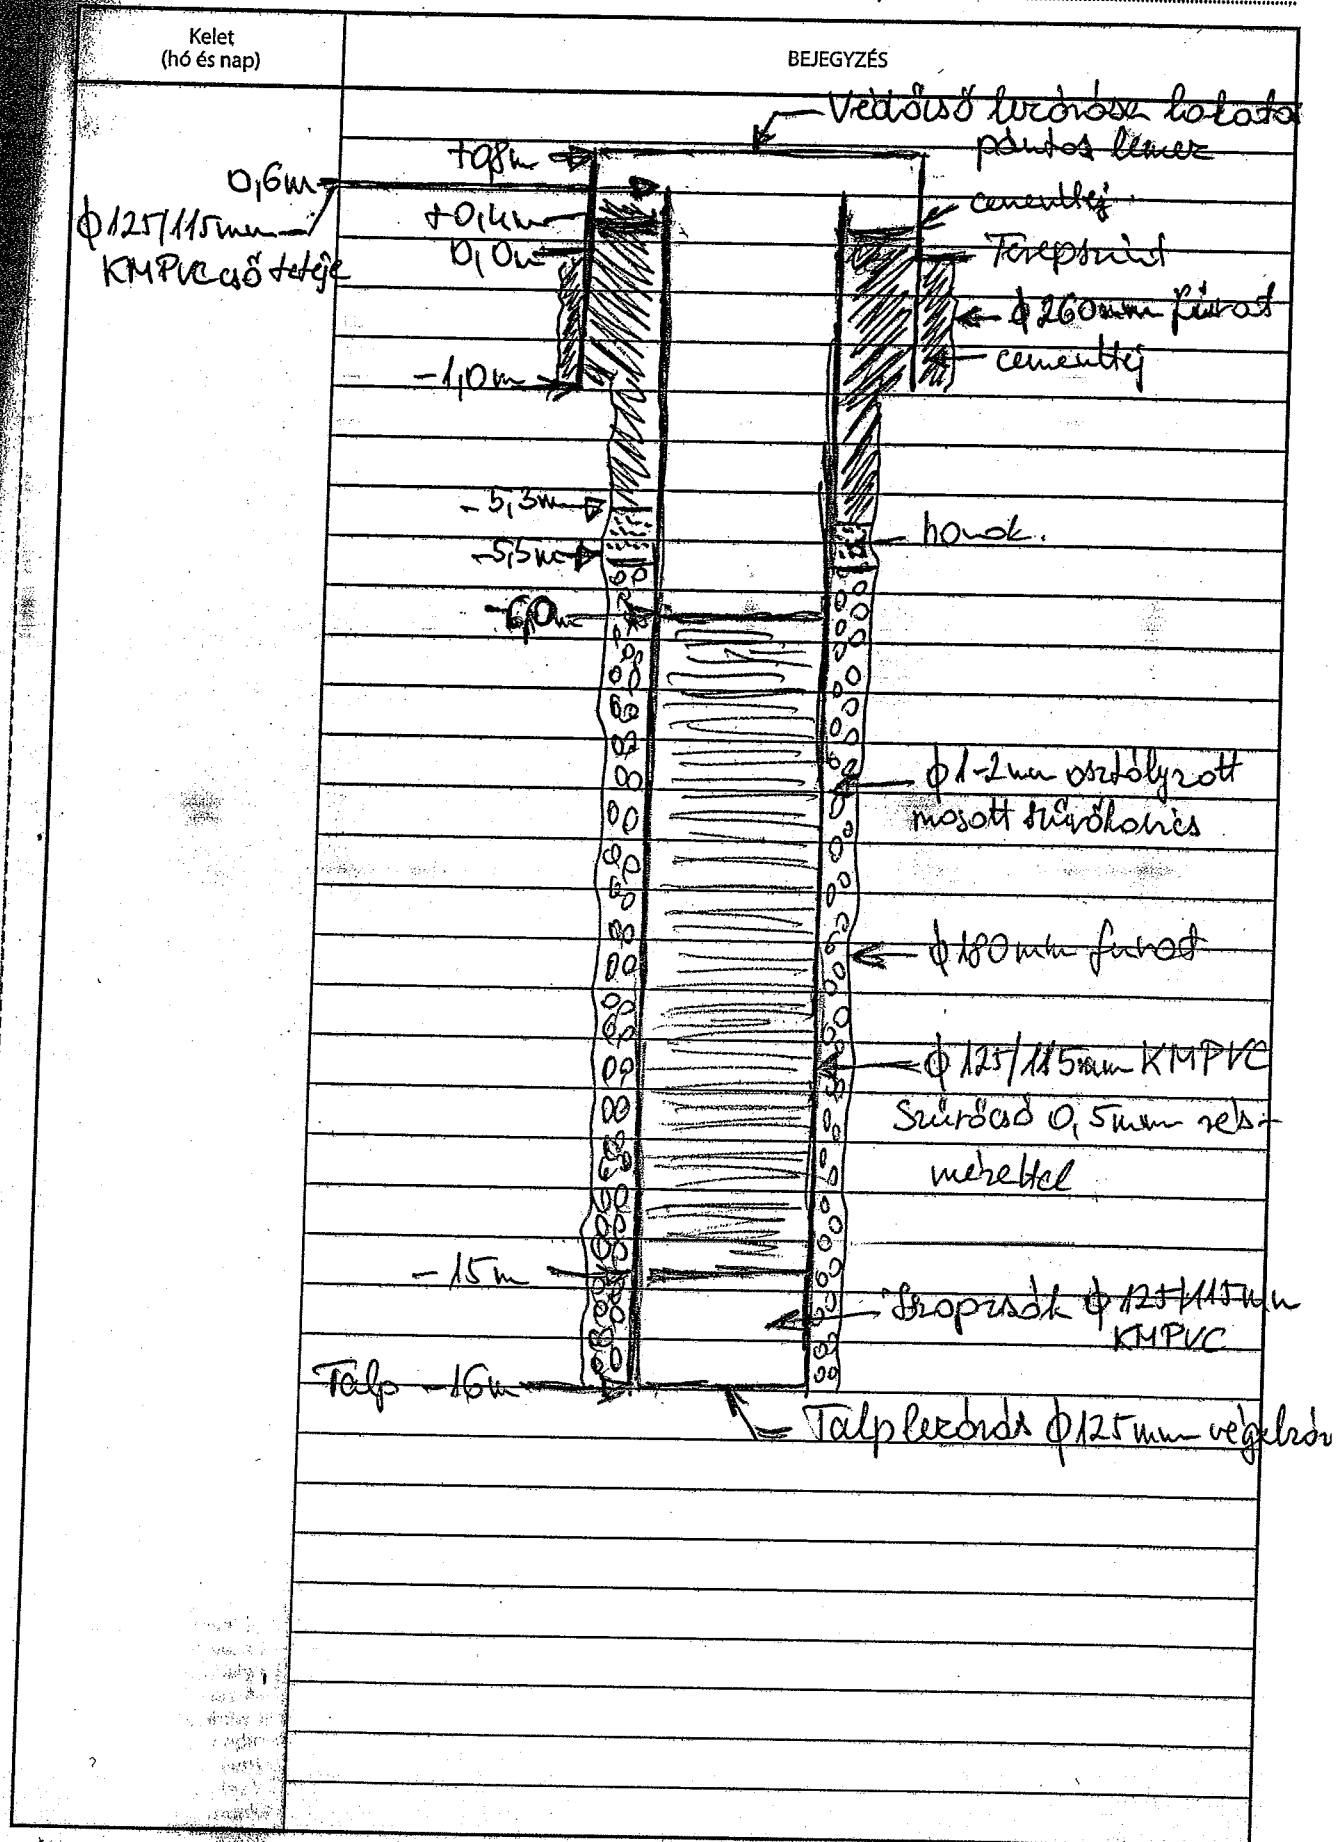

7090

DDNPI/163-11/2017

2017 APR 21

JEGYZŐKÖNYV
vízépítési munkaterület átadásáról

Készült: 2017. 02. 15

Helyszín: Vonatkozó kivitelezési szerződés szerinti helyszínek a barcsi Ó-Dráva térségében

Tárgy:

LIFE Old-Dráva LIFE13/Nat/Hu388 pályázat keretében a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35200/153-7/2017 ált. számú vízjogi létesítési engedély alapján kialakításra kerülő 2 darab talajvízszint figyelő kút kialakítása munkaterületeinek átadása.

Építető: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 7625 Pécs, Tettye tér 9. (továbbiakban: **Építető**)

képviselőiben:

Parrag Tibor osztályvezető

Fenyősi László, osztályvezető

Kivitelező képviselőiben:

TM Hidro-Szer Kft.

(továbbiakban kivitelező)

képviselőiben:

Nagy Béla

Zubor József

Részvevő felek rögzítik, hogy a tárgyi beruházás megvalósítására az építető és kivitelező vállalkozási szerződést kötött.

A kivitelezési munkának megkezdése érdekében építető az vízépítési munkaterületet a szerződés szerint átadja továllalkozó kivitelező részére.

Építető felhívja a kivitelező figyelmét arra, hogy a vízépítési munkákat a vonatkozó kiviteli terv szerinti műszaki tartalommal és a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35200/153-7/2017 számon kiadott vízjogi létesítési engedélyekben foglalt feltételekkel kell megvalósítani.

A munkavégzés a fenti engedély jogerőre emelkedése után lehet csak megkezdeni.

A munkálatok megkezdésének pontos időpontja ismeretében az építető a fenti engedélyben foglalt bejelentési kötelezettségének a katasztrófavédelem felé eleget fog tenni.

A kivitelezés során a kivitelező köteles az egyes munkafázisokat fényképfelvételekkel is dokumentálni és azokat a munkaelvégzése után építető rendelkezésére bocsájtani.

A kivitelezés során felmerülő akadályokról, nem várt eseményekről a kivitelező haladéktalanul értesíti az építető képviselőjét, Fenyősi Lászlót a 30/377-3414 telefonszámon.


Eszrevételek:

Jegyzőkönyv lezárva kmf.

Építető képviselőjében:



Tervező képviselőjében:




Vezető, építési és üzleti ügyek
Székhely: 1022 Pécs, Váradi u. 21/a
Telefon: 30/377-3414
